



Energía de Santa Fe

SANTA FE, 16 de abril de 2019

LICITACIÓN PÚBLICA N° 3365


**OBRA: "ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE
FUENTES RENOVABLES A TRAVÉS DE EPESF"**

CIRCULAR N° 5

ANEXO I DEL PLIEGO COMPLEMENTARIO

En virtud de la **Nueva Fecha de Apertura de Ofertas Técnicas** a realizarse el día **16/05/2019** a las **10:30 horas** en el **Salón Dorrego de la Sede de Gobierno de la Ciudad de Rosario** (San Lorenzo 1950 – CP 2000), a continuación, se adjunta el ANEXO I del PLIEGO COMPLEMENTARIO con las correspondientes correcciones.

IMPORTANTE: los sobres con las propuestas se recibirán **SIN EXCEPCIÓN** hasta las **12:00 horas del día 15/05/2019** en las oficinas de la EPESF sitas en calle Francisco Miguens 260 – 5to Piso – Puerto de Santa Fe – (3000) Santa Fe.



Ing. Germán Gustavo Lorenzón
Jefe Área Desarrollo de Inversiones
Gerencia de Infraestructura
Empresa Provincial de la Energía

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE
GERENCIA INFRAESTRUCTURA

Av. Francisco Miguens N° 260-Piso 12 (3000) Santa Fe. Tel: 0342-4505829-Internos 1290-91-92-93


ANEXO I HITOS DEL CONTRATO

| HITOS | ACTIVIDAD | FECHA |
|-------|--|------------------------------|
| 1 | Publicación Licitación Pública y Venta de Pliegos | 11/02/2019 |
| 2 | Presentación de Ofertas y Entrega de Sobres hasta | 15/05/2019 – 12:00 hs |
| 3 | Apertura de Ofertas Técnicas (Sobre A) | 16/05/2019 |
| 4 | Evaluación y Publicación de Ofertas Técnicas | 05/06/2019 |
| 5 | Apertura de Ofertas Económicas (Sobre B) | 12/06/2019 |
| 6 | Informe de Adjudicación para aprobación de Secretaría de Energía | 19/06/2019 |
| 7 | Adjudicación de Ofertas | 26/06/2019 |
| 8 | Firma de Contrato | 10/07/2019 |
| 9 | Inicio de Ejecución | 20 DIAS DE HITO 8 |
| 10 | Finalización de Obras Civiles | 120 DIAS DE HITO 9 |
| 11 | Provisión de Equipamiento de Generación y Transformación | 150 DIAS DE HITO 9 |
| 12 | Montaje electromecánico | 330 DIAS DE HITO 9 |
| 13 | Fecha de Habilitación Comercial | 365 DIAS DE HITO 8 |

Ing. Germán Gustavo Lorenzón
Jefe Area Desarrollo de Inversiones
Gerencia de Infraestructura
Empresa Provincial de la Energía

GANTT DE EJECUCION

| HITOS | ACTIVIDAD | FECHA | Feb 19 | Mar 19 | Abr 19 | May 19 | Jun 19 | Jul 19 | Ago 19 | Sep 19 | Oct 19 | Nov 19 | Dic 19 | Ene 20 | Feb 20 | Mar 20 | Abr 20 | May 20 | Jun 20 | Jul 20 | |
|-------|--|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 1 | Publicación Licitación Pública y Venta de Pliegos | 11/02/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Presentación de Ofertas y Entrega de Sobres hasta | 15/05/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Apertura de Ofertas Técnicas (Sobre A) | 16/05/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Evaluación y Publicación de Ofertas Técnicas | 05/06/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Apertura de Ofertas Económicas (Sobre B) | 12/06/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Informe de Adjudicación para aprobación de Secretaría de Energía | 19/06/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Adjudicación de Ofertas | 26/06/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Firma de Contrato | 10/07/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Inicio de Ejecución | 20 DIAS DE HITO 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Finalización de Obras Civiles | 120 DIAS DE HITO 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Provisión de Equipamiento de Generación y Transformación | 150 DIAS DE HITO 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Montaje electromecánico | 330 DIAS DE HITO 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Fecha de Habilitación Comercial | 365 DIAS DE HITO 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

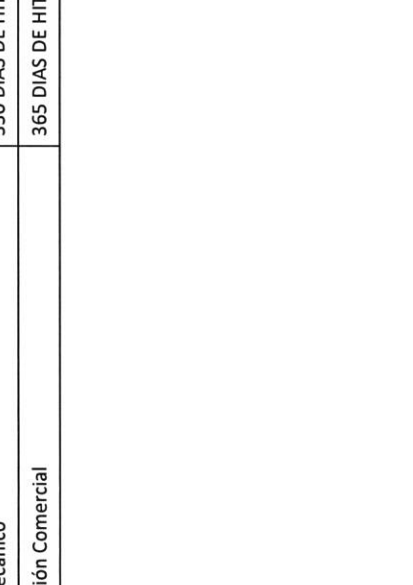

Ing. Germán Gustavo Lorenzón
Jefe Area Desarrollo de Inversiones
 Gerencia de Infraestructura
 Empresa Provincial de la Energía



.....Se ruego devolver debidamente conformado a: EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE – Compras Santa Fe – 5° Piso Avenida Francisco Miguens 260 – Santa Fe

..... Por la presente dejamos constancia de habernos impuesto de lo expresado en vuestra **CIRCULAR N° 5** de la **OBRA: “ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES A TRAVÉS DE EPESF”**

| | |
|-----------|--|
| Pliego N° | |
| Empresa | |
| Domicilio | |
| Tel.: | |
| Fax : | |
